空調設備　搬入計画図

B1F　平面図

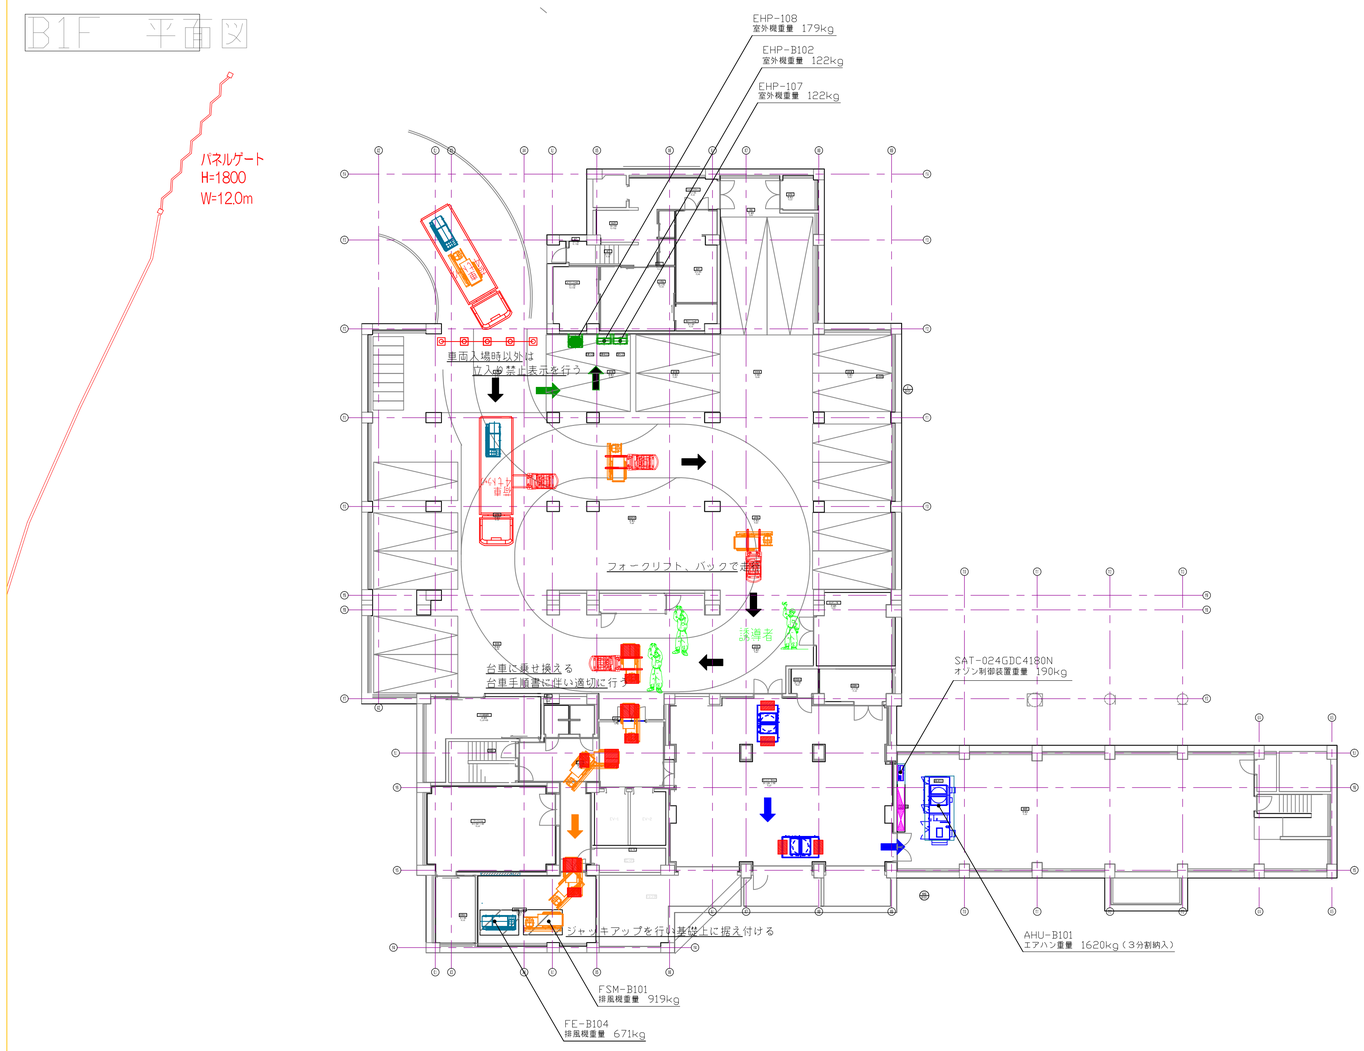

タイムスケジュール

搬　入　機　器　表　　No1

機　器　名	数量	寸法（W D H）	重量(kg)	搬入車両	備考
排風機（FE-B104）	1	2213×1000×1787	671	4t	搬入No1
排煙機（FSM-B101）	1	2480×1228×1992	919		搬入No2
エアハン（AHU-B101）	1組	4032×1360×2252	1620	4t	搬入No3
オゾン制御装置	1	1000×335×1400	190	2t	搬入No4
室外機（EHP-108）	1	920×740×1650	179		搬入No5
室外機（EHP-B102）	1	950×360×1350	122	2t	搬入No6
室外機（EHP-107）	1	950×360×1350	122		搬入No7

確　認　事　項	チェック
1.事前打合せ（作業員全員参加）を行ったか。	
2.作業内容・方法・注意事項等を作業員に周知したか。	
3.有資格者（玉掛け等）の確認をしたか。	
4.クレーン作業の誘導方法を確認したか。	
5.クレーンの設置状況はよいか。	
6.作業半径はよいか。	
7.関係者以外の立入禁止措置はよいか。	
8.玉掛け用具の確認をしたか。（玉掛け点検色の確認）	
9.クレーンの始業前点検はしたか。	
10.吊荷下人払いの徹底はよいか。	
11.横引き作業の重心はよいか。	
12.据付の際、ジャッキの遊びはないか。	

AHU-B101分割図

搬入機器名称	空調設備機器	最大重量	919kg
機器搬入日時	24年　11月　5日（月）8:00 ～（未確定）		
搬入場所			
搬入業者	会社名　株式会社　第一重設機工	電話	03-5679-5351
	住所　東京都江戸川区中葛西3-37-3志美津ビル7階		
クレーン種類			
クレーン接地地盤	□ 舗装面　□ コンクリート面　□ 土砂面　□ その他		
接地地盤強度	□ 強固　□ 軟弱		

作　業　概　要

1）　図の位置に搬入車両（4ｔ車×2台）（2ｔ車×2台）機材車（2ｔ車×1台）を設置します。
2）　搬入機器の車上検査を行います。
3）　搬入車両より、フォークリフトで荷を下ろし、駐車場内を横曳し台車に乗せ換えて据え付けします。
4）　パールにて位置を調整して据付します。
5）　ライナーを使い、パールにて水平を調整して据付けます。
6）　ボルト締めをして締め付けマーキングをして完成です。
7）　各ボルト締めこみ、完成です。
8）　搬入車両、フォークリフト退出させ、清掃、片付けて終了です。

指揮命令系統（特定作業）

統責者
統責者（正）
担当者（副）
措置義務者 安全衛生責任者

（1次連業者）

（2次連業者・搬入業者）

作業指揮者：株式会社　第一重設機工　山本　繁明　玉掛　第96748号

- （株）第一重設機工　小泉　徳男　合図責任者　玉掛　第382459号
- （株）第一重設機工　中野　義一　フォークリフト運転者
- （株）第一重設機工　寒河江　勝次　機器据付責任者　玉掛　第74052号
- （株）第一重設機工　阿久？　秀彦　見張員兼務　玉掛　第91794号
- （株）第一重設機工　中野　健司　運搬時見張員兼務　玉掛　第395870号
- （株）第一重設機工　須藤　栄作　誘導員兼務　玉掛　第90663号

施　工　計　画	チェック欄
1．敷地境界、周囲道路、隣家建物、仮囲い等との位置	記入済
2．クレーン車、積載車の搬入路の障害の有無、車両待機場所の有無	無
3．架空高圧線がある場合の高圧防護管、危険表示など	無
4．道路使用がある場合の警察届出	無
5．機種、能力（作業半径×吊荷重）、最大荷重、最長部材、設置場所	記入済
6．荷捌き用クレーンの必要性	無
7．揚重・搬去順序	記入済
8．揚重開口の計画があるか（小梁はずし、ネットの開閉など）	無
9．移動式クレーンの能力、設置場所、地盤状況、接触防止措置	無
10．近隣上空への旋回リミッターの有無	無
11．立入禁止区域の位置	有
12．警備員に配置、車両・第三者の誘導方法　監視人	有
13．マシンハッチの使用の有無、開口寸法、手摺の有無	無
14．同上既存吊りフック使用の有無、吊り強度の確認	無
15．作業床・ステージ架設の有無	有
16．仮設吊り金具の有無、アンカー強度の有無	無
17．小物の吊り上げ・吊り下げ方法	無
18．チェーンブロック使用の有無、荷重、台数、操作方法。	無
19．横移動台車使用の有無、仕様	有
20．作業手順書の有無	無

事前打合せ会	月　日	月　日	周知会 月　日
当社			
専門工事業者（会社名、氏名）			
備考			
指摘事項			

搬入車両からの荷卸し手順（フォークリフト）

トラック荷台からフォークリフトで揚重　　フォークリフトから平台車への載せ替え　　平台車による運搬作業

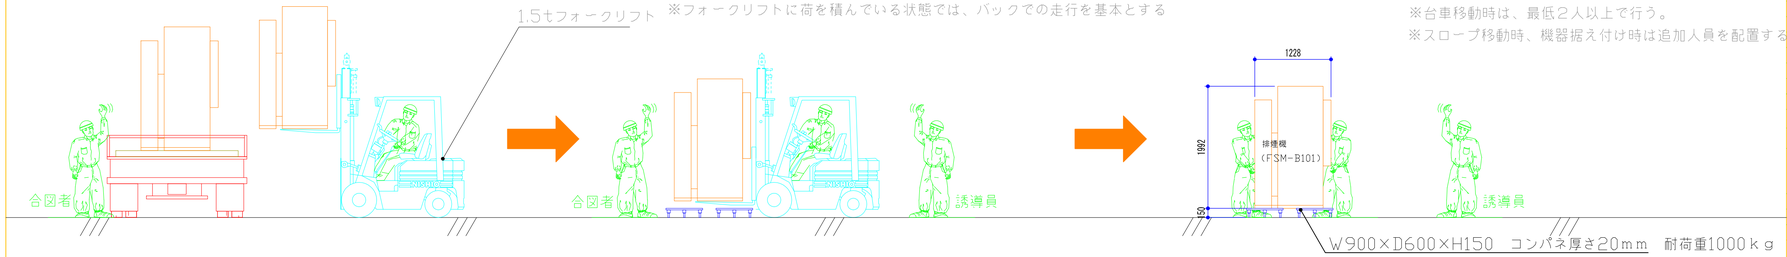

工事部	安全推進部	設備部		作業所		専門工事業者	
工事部長	室長	部長	設備長	所長	担当者	会社（ワンシート審査登録者 / 安全衛生責任者）	作業所（安全衛生責任者）
